

**BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE E
LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE**

**PROGETTO “TOP METRO”
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Relazione di Monitoraggio
01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021**

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Gli obiettivi del progetto

Il progetto ToP Metro della Città metropolitana di Torino (CMT) è costituito da un insieme interrelato ed integrato di interventi finalizzati alla riqualificazione delle periferie e al miglioramento della sicurezza del territorio. Il progetto si inserisce all'interno della visione di sviluppo delineata dal Piano strategico metropolitano il cui obiettivo generale è quello di una "Città della qualità", intesa quale luogo coeso, sano, sicuro e piacevole in cui vivere.

Gli interventi previsti hanno come obiettivo comune quello di concorrere all'integrazione delle diverse parti del territorio metropolitano, al miglioramento della coesione sociale, alla rivitalizzazione e alla crescita economica diffusa nelle periferie. In particolare, il progetto ToP Metro intende essere un primo passo concreto per superare la dicotomia tra centro e periferia e per dotare il territorio metropolitano della capacità di prepararsi al futuro, governando le trasformazioni in una logica di crescita competitiva, in coerenza con la riforma "Delrio" che considera le città metropolitane quali principali motori di sviluppo del Paese.

Attraverso la rigenerazione del tessuto urbano (aree costruite residenziali, aree verdi, spazi pubblici di aggregazione e incontro, recupero e riuso di aree produttive dismesse), incentivi alle imprese, miglioramento dei servizi per la collettività, misure per la prevenzione e l'accrescimento della sicurezza (sia in termini di contrasto ai fenomeni di criminalità, sia come contrasto all'inquinamento e al rischio ambientale), si intende migliorare la qualità della vita della popolazione e il grado di resilienza del territorio.


L'inquadramento urbanistico e i profili di coerenza del progetto

La Città di Torino presenta un tessuto urbano continuo e strettamente connesso ai comuni confinanti della prima cintura. Il territorio in cui l'insediamento si sviluppa presenta caratteristiche morfologiche molto diverse tra loro che si integrano col tessuto urbano, generando nello stesso ambiente sistemi diversi, grazie alla presenza della collina, dei fiumi, dei parchi e delle aree agricole.

L'espansione del tessuto urbano torinese ha avuto inizio dal secondo dopoguerra grazie al boom industriale e al conseguente incremento

demografico dovuto dai flussi migratori provenienti dal Sud Italia. La forte domanda abitativa dell'epoca ha fatto sì che l'urbanizzato non seguisse regole compositive e distributive chiare, dando origine a fenomeni di sprawl diffusi. Le conseguenze di una mancata pianificazione si sentono ancora oggi, a causa dell'assenza di un sistema infrastrutturale ben organizzato, che provoca spesso la marginalità dei comuni limitrofi, generando un'estesa periferia dove i tassi di disoccupazione si concentrano, aggravando i fattori di degrado e insicurezza.

In questo scenario si colloca il Progetto ToP Metro, che interessa i comuni che costituiscono la periferia di prima cintura del Capoluogo. L'area

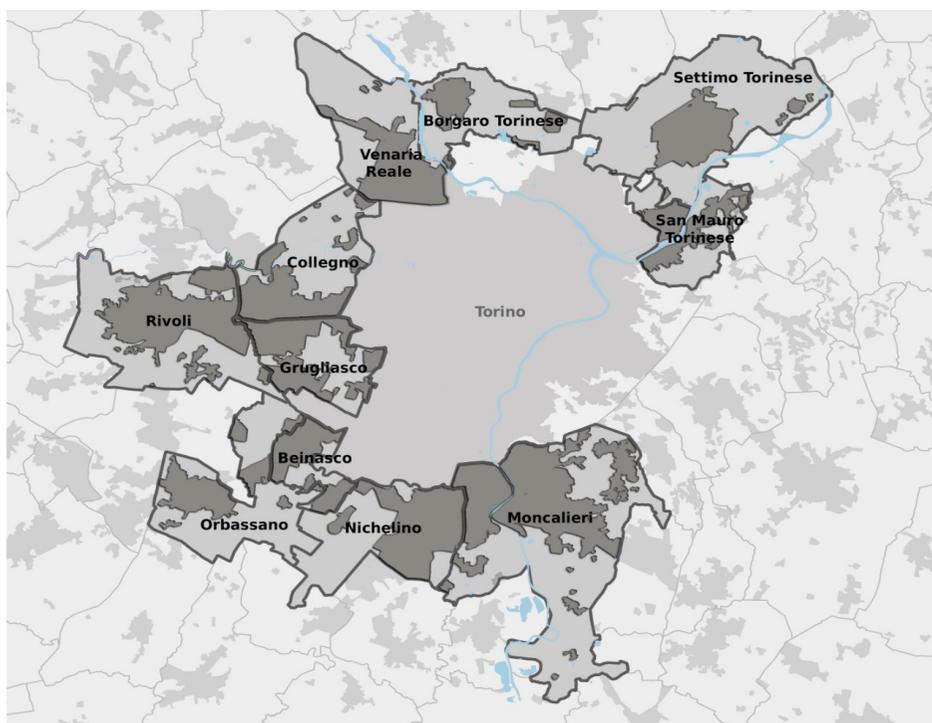

di intervento è rappresentata dagli 11 comuni contermini alla Città di Torino, con popolazione superiore a 10.000 abitanti: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Venaria Reale.

La scelta di circoscrivere l'area d'intervento a soli 11 Comuni contermini a Torino - su un totale di 312 Comuni¹ inclusi nella CMT - ha consentito un effettivo processo di co-progettazione e una più ampia coerenza della proposta progettuale: l'individuazione dei Comuni contermini, che presentano caratteristiche urbane, infrastrutturali e dinamiche socio-economiche simili a quelle della Città stessa, ha infatti favorito l'integrazione tra i diversi interventi previsti, massimizzandone così l'efficacia.

¹ A seguito della fusione di alcuni Comuni, il numero complessivo delle amministrazioni comunali ricomprese nel territorio della CMT è passato da 316 a 312.

Il numero e la tipologia degli interventi

Il progetto comprende 120 interventi, ricadenti in una delle 5 tipologie di azione previste dall'art. 4 comma 3 del Bando di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016, e nello specifico:

- 111 interventi puntuali di livello comunale;
- 5 interventi trasversali, attuati dalla Città metropolitana di Torino e riguardanti la tipologia di azione D
- 4 interventi di area vasta, attuati dalla Regione Piemonte e riguardanti la tipologia di azione E.

Enti attuato-ri	Numero interventi per tipologia d'azione					Tot
	Miglioramento della qualità del decoro urbano (art.4 c.3 lett.a)	Manutenzione, riuso e rifunionalizzaz. di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico (art.4 c.3 lett.b)	Accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana (art.4 c.3 lett.c)	Potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana (art.4 c.3 lett.d)	Mobilità sostenibile e adeguamento infrastrutture per servizi sociali, culturali, educativi e didattici (art.4 co.3 lett.e)	
Beinasco	4	2	0	0	0	6
Borgaro	0	3	0	0	0	3
Collegno	5	13	1	6	0	25
Grugliasco	1	4	4	0	0	9
Moncalieri	0	7	2	0	5	14
Nichelino	0	0	1	0	3	4
Orbassano	0	4	0	0	0	4
Rivoli	1	10	1	0	0	12
San Mauro	3	1	2	0	0	6
Settimo	1	6	1	0	0	8
Venaria	4	6	1	2	7	20
Regione	0	0	0	0	4	4
CMT	0	0	0	5	0	5
Totale	19	56	13	13	19	120

Il numero di interventi differisce da quello indicato nel dossier di candidatura perché tiene conto dei diversi lotti funzionali (considerati come un intervento a sé) e dei nuovi interventi di cui alla rimodulazione approvata con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0000764 del 15 maggio 2018.

Attualmente, per quanto riguarda le fonti di finanziamento, il numero degli interventi autorizzati, finanziati in tutto o in parte a valere sul Programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie è di 72, mentre il numero degli interventi finanziati dai privati o con altre risorse a disposizione degli enti attuatori è pari a 48.

L'importo complessivo del Progetto e le eventuali variazioni rispetto all'importo iniziale

La tabella successiva riporta l'investimento totale del Progetto ToP Metro (euro 113.173.445,97), il contributo richiesto a valere sul Programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (euro **39.658.004,79**) nonché il cofinanziamento pubblico e privato previsto (pari rispettivamente a euro 39.179.236,81 ed a euro 34.336.204,37) .

Enti attuatori	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
Beinasco	4.137.255,66	2.087.328,66	2.025.897,00	24.000,00
Borgaro Torinese	12.822.111,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.822.111,00
Collegno	21.228.022,74	5.378.650,00	5.402.547,15	10.446.825,59
Grugliasco	6.998.500,00	2.970.000,00	3.573.000,00	455.500,00
Moncalieri	10.674.000,00	4.434.000,00	2.072.000,00	4.168.000,00
Nichelino	2.293.000,00	2.053.000,00	50.000,00	190.000,00
Orbassano	4.163.148,00	3.339.085,00	824.063,00	0,00
Rivoli	8.790.431,01	3.935.596,21	2.553.134,72	2.301.700,08
San Mauro Torinese	1.986.460,00	1.986.460,00	0,00	0,00
Settimo Torinese	15.087.377,00	3.680.977,00	5.000.000,00	6.406.400,00
Venaria Reale	12.138.836,34	3.010.836,20	3.696.500,00	5.431.500,14
Regione Piemonte	1.259.884,22	1.259.884,22	0,00	0,00
Città Metropolitana	11.594.450,00	3.522.187,50	139.062,50	7.933.200,00
Totale	113.173.445,97	39.658.004,79	34.336.204,37	39.179.236,81

La Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Torino ha previsto un investimento totale di € 93.006.344,27 e un contributo statale pari € 39.942.803,58.

Successivamente, tali importi sono stati aggiornati, in quanto molti interventi hanno beneficiato di un ulteriore contributo a livello comunale e vi è stata una leggera riduzione (- € 284.798,79) del contributo richiesto.

Il presente monitoraggio conferma i valori del precedente.

Eventuali rimodulazioni del progetto conseguenti alla riprogrammazione di risorse

Successivamente alla prima richiesta di rimodulazione approvata con vs nota del del 15 maggio 2018 sopra citata, si sono rese necessarie ulteriori **richieste di rimodulazione** ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Convenzione, e precisamente:

- **Città di Borgaro**, intervento **"B1-BOR** - Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia"
- **Città di Nichelino**, intervento **"E2-NIC** - Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni";
- **Città Metropolitana di Torino - D1 Mip al ToP**
- **Città Metropolitana di Torino - D2-CMTO Top Edge**
- **Comune di Rivoli**, come già indicato nella precedente Relazione di monitoraggio, al fine di finanziare le maggiori spese sopravvenute per l'intervento **"B3-RIV** messa in sicurezza ed adeguamento normativo scuola media Gobetti" ha richiesto di utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita all'intervento **"B8.1- RIV"**, il quale sarà sostenuto con un pari aumento del contributo a carico del Comune e dal previsto contributo con fondi privati;
- **Città di Settimo Torinese**: l'Amministrazione comunale ha chiesto di rimodulare l'intervento **B.1.2** relativo alla nuova sede del comando della Polizia Locale in Stazione a favore del nuovo intervento **"B8** - riqualificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo nuovo" (importo totale in rimodulazione 1.000.000 €). La motivazione della richiesta risiede, in parte nell'impossibilità di avere tempi certi di attuazione della nuova sede del comando di Polizia municipale e in parte dalla necessità, valutata dalla nuova Amministrazione comunale, di sostenere prioritariamente la riqualificazione del Borgo nuovo, quartiere popoloso e in declino;

- **Comune di San Mauro Torinese:** il comune ha inizialmente espresso la necessità di potenziare e di investire maggiormente sull'intervento "B1-SAN – Area verde Pragrande" chiedendo di poter utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita ai tre interventi: "A1-SAN– Sistemazione area verde del Porto", "A2-SAN–Riquilificazione Via Mirande", "C2-SAN – Realizzazione orti urbani nel distretto di Sambuy", da realizzarsi in tempi diversi con risorse comunali. Successivamente tale proposta è stata riportata alla originaria impostazione.

Con nota prot. 0000383 del 20/05/2020 il Gruppo di monitoraggio della presidenza ha **approvato le rimodulazioni** relative a: **Città metropolitana di Torino, Rivoli, Nichelino e Borgaro.**

Tutte le richieste sopracitate non modificano il contributo statale previsto.

Il cronoprogramma di realizzazione del Progetto complessivo e per singoli interventi

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 108/2018 (legge di conversione del cosiddetto decreto "Milleproroghe"), che ha differito al 2020 l'efficacia delle Convenzioni sottoscritte tra la Presidenza del Consiglio, molti enti attuatori hanno sospeso l'esecuzione degli interventi, in attesa di avere certezze rispetto al finanziamento statale.

L'art. 1, commi da 913 a 916, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 914 ha previsto che le Convenzioni sottoscritte nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie producano nuovamente effetti a partire dal 2019, e il comma 916, che ha previsto l'adeguamento delle Convenzioni già sottoscritte.

Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto di modificare la Convenzione a suo tempo sottoscritta con la Città Metropolitana di Torino ed ha inviato il nuovo testo in data 25/02/2019 a mezzo pec. Tale nuova Convenzione di modifica è stata sottoscritta dalla Sindaca Metropolitana in data 06/03/2019 (Decreto della Sindaca metropolitana n. 69-2280/2019 del 06/03/2019). Il 21/03/2019 la medesima Convenzione è stata sottoscritta anche dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio in data 08/04/2019 ed è stata approvata con Decreto del Segretario generale e il 28/05/2019. La Corte dei Conti ha comunicato di avere registrato la Convenzione di modifica (n. registrazione 1-1065/2019).

Visto quindi il clima di incertezza generato dalla sospensione dell'efficacia delle convenzioni e, successivamente, dalla ripresa del Programma, alcuni Enti attuatori hanno ritenuto di procedere a richieste di **proroghe, fermo restando che le nuove tempistiche di ultimazione previste devono necessariamente tenere conto anche del periodo di sospensione** della convenzione disposta dalla legge n 108/2018 "Milleproroghe",

come anche indicato dalla nostra nota del 14/03/2019 ns. prot. 23959, ovvero *“in considerazione del fatto che la Convenzione risultava sospesa ex lege dalla data di entrata in vigore della Legge n. 108/2018 “Milleproroghe” (22/09/2018) sino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 n. 145/2018 (01/01/2019) e perfeziona i suoi effetti una volta registrata la Convenzione di Modifica alla Corte dei Conti si ritiene che detta sospensione sia da applicare a tutti gli interventi del Progetto “Top Metro” in aggiunta rispetto ad eventuali proroghe adeguatamente motivate”.*

Il Gruppo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato le proroghe trasmesse da aprile 2019 a febbraio 2020 con le note prot. n. 0001255 dell’ 08/11/2019 e prot. n. 0000383 del 20/05/2020

L’**emergenza epidemiologica Covid-19** ha inevitabilmente condizionato alcuni interventi facenti parte del progetto, i quali, estremamente trasversali nelle loro caratteristiche, hanno registrato varie casistiche di difficoltà.

La Città Metropolitana di Torino, vista la criticità a livello generale che si stava delineando a causa dell’epidemia di Covid-19, già all’inizio del mese di marzo 2020 aveva richiesto una proroga di 6 mesi per l’intero progetto “ToP Metro”, ma gli scenari che si sono successivamente delineati hanno richiesto una ricognizione di tutti gli interventi del Progetto.

Nel primo semestre del 2020, le chiusure forzate disposte dai Decreti nazionali e periodo del lockdown nazionale di marzo per far fronte all’epidemia da Covid-19, hanno inevitabilmente arrestato quasi tutti gli interventi in corso che prevedevano dei **lavori edili**, con ricadute sia sull’operatività dei cantieri che per le aggiudicazioni dei lavori a causa dell’impossibilità di effettuare spostamenti per sottoscrivere i contratti o prendere in consegna i lavori.

Successivamente sono riprese le attività edili, le quali hanno via via superato le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e sono proseguite le operazioni tecnico-amministrative per adeguare le lavorazioni ai protocolli anti-contagio, che hanno chiaramente determinato degli imprevedibili ritardi nelle tempistiche di realizzazione delle opere, stabilendo, a loro volta, nuove tempistiche di esecuzione in quanto le attività hanno dovuto essere completamente ripensate e ripianificate, soprattutto per gli interventi che vedono la compresenza di maestranze in luoghi chiusi.

Anche gli interventi che prevedono attività frontali, come la formazione o gli scambi culturali, sono stati efficacemente riprogrammati, prevedendo un modo alternativo nella somministrazione delle stesse.

Le segnalazioni di sofferenza tempistica ed economica (extra costi di adeguamento dei protocolli sanitari) segnalate dai RUP dei vari interventi sono stati tradotti, nel mese di luglio del 2020, in una ricognizione completa delle tempistiche e conseguente richiesta di proroga trasmessa con

ns prot. n. 53438/SA0/2020 del 31/07/2020. Il Gruppo di monitoraggio della Presidenza con nota n. 0000975 del 19/11/2020 ha approvato tale richiesta.

Nel corso dell'ultimo semestre si è registrata la conclusione di molti interventi ed il programma procede con le tempistiche previste. Tali risultati stanno producendo concreti e fattivi effetti sul territorio e sui suoi abitanti. Le amministrazioni locali, di concerto con la Città metropolitana di Torino, stanno procedendo alle inaugurazioni delle strutture realizzate, dandone adeguato risalto nelle varie forme di comunicazione. Sulla pagina web dedicata sul sito internet della Città metropolitana di Torino è stata aperta una apposita sezione che mostra gli avanzamenti dei vari interventi.

Tuttavia, unicamente riguardo a due interventi sono state segnalate nel corso del semestre gennaio 2021/giugno 2021 delle criticità e per tali motivi è stata formulata idonea richiesta di proroga come previsto dalla Convenzione. Con nota numero 0000934230721 del 23/07/2021 è stata concessa la proroga richiesta.

Di seguito si riportano le date di ultimazione lavori approvata e di conclusione:

ID	Ente Attuatore	Codice Intervento	Denominazione Intervento	data fine lavori Cronoprogramma Approvato	data fine Lavori	data CRE	Data determina Approvazione CRE
1	Comune di Beinasco	A1-BEI	Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
2	Comune di Beinasco	A2-A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento	09/04/2021	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		
3	Comune di Beinasco	A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto – Area Cimitero	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
4	Comune di Beinasco	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	09/04/2021	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		

5	Comune di Beinasco	B2-BEI	Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto	09/11/2020	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		
6	Comune di Borgaro	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo Lotto I	LOTTO I 09/10/2022			
				LOTTO II 28/02/2020	27/12/2019	06/03/2020	31/03/2020
7a	Comune di Collegno	A1-COL	Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio.	09/02/2020	30/12/2019	10/01/2020	10/02/2020
7b	Comune di Collegno	A2- COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	09/02/2020	30/12/2019	30/12/2019	04/03/2020
8a	Comune di Collegno	B1A-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	09/02/2020	27/07/2019	22/11/2019	05/08/2020
8b	Comune di Collegno	B1-B-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	09/02/2020	31/12/2019	10/01/2020	15/05/2020
8c	Comune di Collegno	B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness Diffuso	09/02/2020	15/11/2019	10/01/2020	18/03/2020
8d	Comune di Collegno	B3A-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	09/02/2020	26/06/2019	27/08/2019	28/01/2020
8e	Comune di Collegno	B3B-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	09/02/2020	04/12/2019	16/01/2020	28/05/2020
9	Comune di Collegno	B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	09/06/2020	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020
10	Comune di Collegno	B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	30/06/2022			
11	Comune di Collegno	C1/C2/C3-COL	Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di Supporto	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	
12a	Comune di	A3/D1a/	Riquilificazione urbana e coesione sociale	09/01/2021	31/12/2020	12/02/2021	18/02/2021

	Collegno	D3/D4-COL					
12b	Comune di Collegno	D1b-COL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	09/01/2021	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		
13	Comune di Grugliasco	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti – Montanaro	09/08/2021			
14	Comune di Grugliasco	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	09/05/2022			
15	Comune di Grugliasco	B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	09/10/2021			
16a	Comune di Grugliasco	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
16b	Comune di Grugliasco	C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa Civile	09/05/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
16c	Comune di Grugliasco	C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	09/10/2019	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
16d	Comune di Grugliasco	C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	09/10/2019	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
17	Comune di Moncalieri	B1-MON	Riquilificazione di arterie viarie - C.so Trieste	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
18	Comune di Moncalieri	B2-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Via Pastrengo	09/04/2021	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
19	Comune di Moncalieri	B3-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. Stupinigi	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
20	Comune di Moncalieri	B4-MON	Riquilificazione di arterie viarie - P.zza del Mercato	09/01/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
21	Comune di	B5-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. Palera	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO –		

	Moncalieri				EROGATO SALDO		
22	Comune di Moncalieri	B6-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo	09/04/2021	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
23	Comune di Moncalieri	B7-MON	Ulteriori lavori di riquilificazione di arterie viarie	15/09/2020	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
24	Comune di Moncalieri	C2-MON	Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - Nuova Caserma Polizia Locale	22/02/2021	30/09/2020	04/02/2020	16/02/2021
25	Comune di Moncalieri	E2-MON	Adeguamento Scuola Luigi Pirandello	15/07/2019	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
26	Comune di Moncalieri	E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	30/08/2019	INTERVENTO ULTIMATO – EROGATO SALDO		
27	Comune di Moncalieri	E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	15/07/2020	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		
28	Comune di Moncalieri	E5-MON	Installazione nuove postazioni Bike Sharing	15/07/2019			
29	Comune di Nichelino	C1-NIC	Manutenzione straordinaria caserma carabinieri	09/04/2021	19/02/2021	15/07/2021	IN CORSO
30	Comune di Nichelino	E1-NIC	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto	09/10/2020	04/08/2020	05/03/2021	14/04/2021
31	Comune di Nichelino	E2-NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni	09/11/2022			
32	Comune di Orbassano	B1-ORB	Rifunionalizzazione, consolidamento strutturale e restauro conservativo del Palazzo Comunale e del campanile in Piazza Umberto I	09/12/2022			
33	Comune di Orbassano	B2-ORB	Restauro conservativo e rifunionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	09/01/2023			
34	Comune di	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e riquilificazione	09/10/2019	INTERVENTO ULTIMATO –		

	Rivoli		del sito		RICHIESTO SALDO		
35	Comune di Rivoli	B1-RIV	Riquilificazione impianti di illuminazione pubblica	09/10/2019	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		
36	Comune di Rivoli	B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	30/06/2023			
37	Comune di Rivoli	B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole infanzia Casa del Sole e Rodari - Lotto I Casa del Sole	09/04/2020	INTERVENTO ULTIMATO – RICHIESTO SALDO		
39	Comune di Rivoli	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione sistema di videocontrollo del territorio	15/03/2023			
40	Comune di San Mauro T.se	A1-SAN	Sistemazione Area verde di Via del Porto	30/11/2022			
41	Comune di San Mauro T.se	A2-SAN	Riquilificazione di Via Mirande	31/12/2022			
42	Comune di San Mauro T.se	A3-SAN	Lavori di riqualificazione di Via Casale	09/08/2020	13/03/2020	06/04/2020	16/04/2020
43	Comune di San Mauro T.se	B1-SAN	Area verde Pragranda	30/06/2021	01/07/2020	20/10/2020	11/11/2020
44	Comune di San Mauro T.se	C1-SAN	San Mauro Sicura	09/11/2020	18/09/2020	06/11/2020	06/11/2020
45	Comune di San Mauro T.se	C2-SAN	realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy	30/11/2022			



46	Comune di Settimo T.se	A1-SETT	Riquilificazione di via Roma in Settimo Torinese	09/08/2019	29/06/2019	05/08/2019	19/11/2019
47	Comune di Settimo T.se	B1-SETT-2	Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale	richiesta di rimodulazione			
48	Comune di Settimo T.se	B3-SETT	Riquilificazione impianti sportivi scuola media statale "A. Gramsci"	09/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	19/11/2020
49	Comune di Settimo T.se	B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	15/10/2021			
50	Comune di Venaria	A2-VEN	Riquilificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	31/05/2021	26/05/2021	IN CORSO	IN CORSO
51	Comune di Venaria	B2-1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici (MAN. FASE 4)	09/12/2020	04/09/2020	18/12/2020	21/01/2021
52	Comune di Venaria	B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	09/07/2021	24/05/2021	IN CORSO	IN CORSO
53	Comune di Venaria	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	09/04/2020	13/02/2020	20/02/2020	20/02/2020
54	Comune di Venaria	D1-VEN	Progetto Housing Sociale "Cà Buozzi"	09/04/2022			
55	Comune di Venaria	E2-VEN-A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	28/02/2021	25/02/2021	IN CORSO	IN CORSO
56	Comune di Venaria	E3-VEN-A3	Riquilificazione impianti Illuminazione Pubblica	31/12/2020	lavori conclusi (l'intervento fa parte di un progetto che interessa una vasta area)	IN CORSO	IN CORSO

					comunale ed il collaudo comprenderà il progetto nel suo insieme)		
57a	Regione Piemonte	E1-CORV-1	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie – Governance	09/12/2021			
57b	Regione Piemonte	E1-CORV-2	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	09/02/2022			
57c	Regione Piemonte	E1-CORV-3	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	09/12/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
57d	Regione Piemonte	E1-CORV-4	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie – Comunicazione	09/06/2022			
58	CMTO	D1-CMTO	Mip al Top	30/06/2023			
59	CMTO	D2-CMTO	Top Edge	30/06/2023			
60a	CMTO	D3-CMTO-1	Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	09/01/2022			
60b	CMTO	D3-CMTO-2	Fa Bene: materiali promozionali	09/04/2021	intervento ultimato-posa in corso		

Interventi conclusi rispetto al totale:

semestre precedente:

semestre attuale:

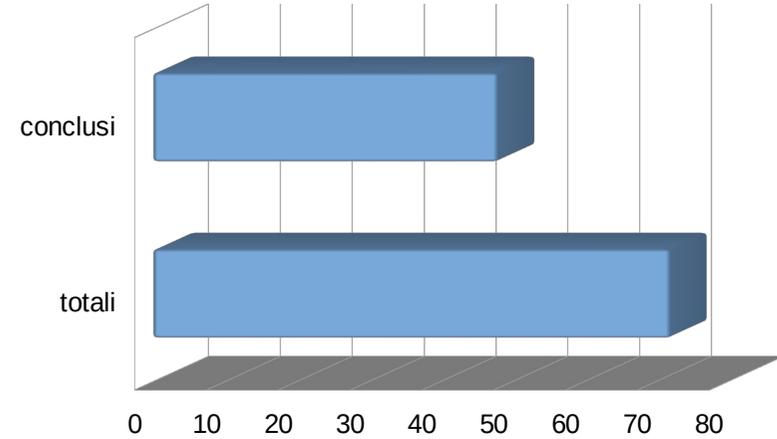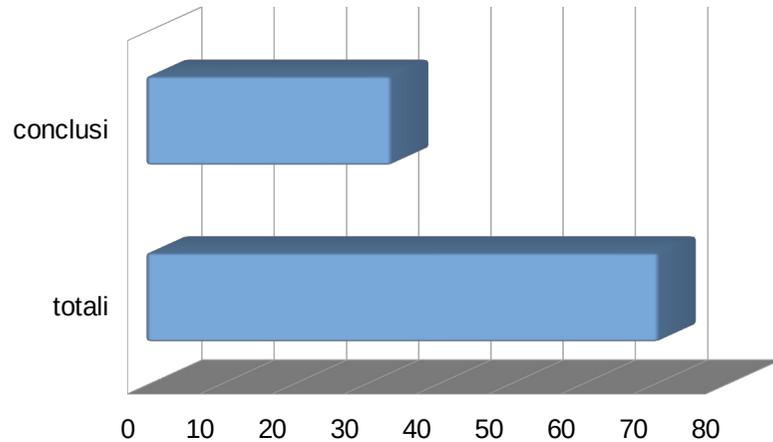

Complessivamente, risultano ultimati 48 interventi su 72, ovvero il 66% del totale.

Di questi, 23 hanno già presentato la documentazione conclusiva per l'erogazione della quota finale.

Impegni contrattualizzati, costi realizzati e pagamenti effettuati

Relativamente al semestre considerato, gli importi complessivi del Progetto ToP Metro sono i seguenti:

- impegni contrattualizzati nel semestre: euro 6.749.365,87
- spese sostenute nel semestre: euro 4.403.406,53

- pagamenti effettuati nel semestre: euro 4.664.628,39
- totale spese sostenute: euro 20.065.956,26

Gli impegni contrattualizzati totali fino al 30/06/2021 sono stati pari ad euro 57.680.248,11

Rendicontazione delle spese

Dall'inizio del programma ad oggi, sono state effettuate **cinque rendicontazioni delle spese** sostenute e certificate, come previsto dalla Convenzione art. 7, richiedendo le seguenti risorse:

- primo semestre 2019 importo di € 2.463.131,71 **approvata** con nota della Presidenza del Consiglio prot. 0000382 del 20/05/2020;
- secondo semestre 2019 importo di € 3.235.206,36 **approvata** con nota della Presidenza del Consiglio prot.. 0000490 del 18/06/2020;
- primo semestre 2020 importo di € 3.320.527,83 , **approvata** con nota della Presidenza del Consiglio prot.. 0000961 del 18/11/2020;
- secondo semestre 2020 importo di € 5.327.732,83 **approvata** con nota della Presidenza del Consiglio prot.0000630 del 07/06/2021;
- primo semestre 2021 importo di € 3.129.247,61, **in attesa di approvazione**

Per un totale di € **17.475.846,34**.

In concomitanza con la terza rendicontazione, in data 30/06/2020 è stata trasmessa, con separata nota, la **richiesta della quota finale pari al 5% finale** relativa agli interventi ultimati che hanno fatto richiesta ed allegato la documentazione prescritta dalla Convenzione:

Città di Moncalieri:

- B1-MON Riqualficazione di arterie viarie - C.so Trieste
- B4-MON Riqualficazione di arterie viarie - P.zza del Mercato
- B6-MON Riqualficazione di arterie viarie - Str. del Bossolo
- E2-MON Adeguamento Scuola Luigi Pirandello

per un importo totale di € **34.418,18**. Con nota prot. 0000961 del 18/11/2020 della Presidenza del Consiglio è stata comunicata l'approvazione della cifra relativa alla 3^a rendicontazione - giugno 2020, unitamente alla quota finale dei sopracitati interventi per la cifra richiesta (€ **34.418,18**).

In occasione della quarta rendicontazione di dicembre 2020, in data 29/12/2020 è stata trasmessa, con separata nota, la **richiesta della quota finale pari al 5% finale** relativa agli interventi:

Comune di Beinasco:

- A1-BEI Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest
- A4-BEI Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero

Comune di Grugliasco

- C1-GRU integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione
- C2-GRU modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile
- C3-GRU sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina
- C4 GRU integrazione presso la centrale operativa difesa civile - municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze

Comune di Moncalieri:

- B2-MON Riqualficazione di arterie viarie - Via Pastrengo
- B3-MON Riqualficazione di arterie viarie - Str. Stupinigi
- B5-MON Riqualficazione di arterie viarie - Str. Palera
- B7-MON Ulteriori lavori di riqualficazione di arterie viarie
- E3-MON Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori

per un importo totale di € **199.092,11**. Con nota prot. prot.0000630 del 07/06/2021 della Presidenza del Consiglio è stata comunicata l'approvazione della cifra relativa alla 4^a rendicontazione - dicembre 2020, unitamente alla quota finale dei sopracitati interventi per la cifra richiesta.

In occasione della quinta rendicontazione di giugno 2021, in data 29/06/2021 è stata trasmessa, con separata nota, la **richiesta della quota finale pari al 5% finale** relativa agli interventi:

Comune di Beinasco:

- A2/A3-BEI Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento;
- B1-BEI Progetto di restauro ex chiesa Santa croce;
- B2-BEI Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto.

Comune di Collegno:

- D1b_COL Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità

Comune di Moncalieri:

- E4_MON Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili

Comune di Rivoli:



- A1_RIV Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e riqualificazione del sito;
- B1_RIV Riquilificazione impianti di illuminazione pubblica;
- B6_RIV Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari;

per un importo totale di € **139.501,28**, in attesa di approvazione.

Complessivamente sono state richieste risorse per € **17.848.857,91 pari a circa il 45% del contributo statale.**

Contributo richiesto ed erogato, contributo erogato/ contributo residuo

semestre precedente:

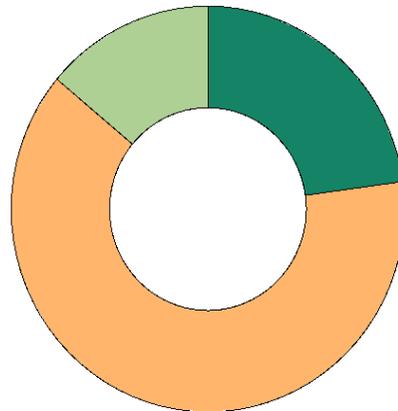

II

semestre attuale:





grafico mostra l'avanzamento nella richiesta del contributo ministeriale.

Lo stato degli interventi e il livello di attuazione

La tabella seguente riporta lo stato degli interventi finanziati (interventi attivi, sospesi e critici) e il livello di attuazione degli stessi (approvazione capitolato d'oneri, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo, in fase di gara/bando, in esecuzione, stato finale dei lavori, collaudo).

Come si può notare, gli interventi, nonostante le criticità già note in merito alla sospensione dell'efficacia delle Convenzioni ed all'emergenza sanitaria, hanno proseguito il loro iter.

Complessivamente, risultano ultimati n. 48 interventi su 72, ovvero il 66%. Di questi, 23 hanno presentato la documentazione conclusiva per l'erogazione della quota finale e per 15 interventi tale quota finale è stata già erogata.

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione	Note
Beinasco	1	A1-BEI	Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	2	A2/A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale
	3	A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	4	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale
	5	B2-BEI	Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione	Note
Borgaro T.se	6	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo	Attivo	In esecuzione - intesa come totalità del progetto, in quanto il lotto funzionale II relativo alla sola Via Svizzera è collaudato e per il lotto di Via Lanzo è stata approvata la rimodulazione e si è avviata la procedura propedeutiche alla gara	
Collegno	7a	A1-COL	Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio.	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	7b	A2- COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	8a	B1a-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	8b	B1b-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	8c	B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness diffuso	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	8d	B3a-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	8e	B3b-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	9	B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	10	B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	Attivo	In esecuzione	

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione	Note
	11	C1/C2/C3-COL	Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	12a	A3/D1a/D3/D4-COL	Riquilibrata urbana e coesione sociale	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	12b	D1b-C OL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale
Grugliasco	13	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro	Attivo	In esecuzione	
	14	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	Attivo	In fase di gara/bando	
	15	B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	Attivo	In esecuzione	
	16a	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	16b	C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	16c	C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	16d	C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
Moncalieri	17	B1-MON	Riquilibrata di arterie viarie - C.so Trieste	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	18	B2-MON	Riquilibrata di arterie viarie - Via Pastrengo	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	19	B3-MON	Riquilibrata di arterie viarie - Str. Stupinigi	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	20	B4-MON	Riquilibrata di arterie viarie - P.zza del Mercato	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione	Note
	21	B5-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. Palera	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	22	B6-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	23	B7-MON	Ulteriori lavori di riquilificazione di arterie viarie	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	24	C2-MON	Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - Nuova Caserma Polizia Locale	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	25	E2-MON	Adeguamento Scuola Luigi Pirandello	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	26	E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – erogata quota finale
	27	E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale
	28	E5-MON	Installazione nuove postazioni Bike Sharing	Non Attivo	-	
Nichelino	29	C1-NIC	Manutenzione straordinaria caserma carabinieri	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	30	E1 - NIC	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	31	E2 - NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni	Attivo	In esecuzione	
Orbassano	32	B1-ORB	Rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale e restauro conservativo del Palazzo Comunale e del campanile in Piazza Umberto I	Attivo	In esecuzione	
	33	B2-ORB	Restauro conservativo e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	Attivo	In esecuzione	
Rivoli	34	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e riquilificazione del sito	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione	Note
	35	B1-RIV	Riquilificazione impianti di illuminazione pubblica	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale
	36	B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	Attivo	In esecuzione	
	37	B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole materne e elementare Casa del Sole e Rodari	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato – richiesta quota finale
	39	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione sistema di videocontrollo del territorio	Attivo	In fase di gara/bando	
San Mauro T.se	40	A1-SAN	Sistemazione Area verde di Via del Porto	Attivo	Approvazione progetto esecutivo	
	41	A2-SAN	Riquilificazione di Via Mirande	Attivo	Approvazione progetto esecutivo	
	42	A3-SAN	Lavori di riquilificazione di Via Casale	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	43	B1-SAN	Area verde Pragranda	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	44	C1-SAN	San Mauro Sicura	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	45	C2-SAN	realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy	Attivo	Approvazione progetto esecutivo	
Settimo T.se	46	A1-SETT	Riquilificazione di via Roma in Settimo Torinese	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	47	B1-SETT_2	Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale	Attivo	Approvazione progetto esecutivo	
	48	B3-SETT	Riquilificazione impianti sportivi scuola media statale "A. Gramsci"	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	49	B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	Attivo	In esecuzione	
	50	A2-VEN	Riquilificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	Attivo	Stato finale dei lavori	Intervento ultimato

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione	Note
Venaria Reale	51	B2.1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici (MAN. FASE 4)	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	52	B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	Attivo	Stato finale dei lavori	Intervento ultimato
	53	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	54	D1-VEN	Progetto Housing Sociale "Cà Buozi"	Attivo	In esecuzione	
	55	E2-VEN A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	Attivo	Stato finale dei lavori	Intervento ultimato
	56	E3-VEN A3	Riquilificazione impianti Illuminazione Pubblica	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
Regione Piemonte	57a	E1-CORV_1	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Governance	Attivo	In esecuzione	
	57b	E1-CORV_2	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	Attivo	In esecuzione	
	57c	E1-CORV_3	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	Attivo	Collaudo	Intervento ultimato
	57d	E1-CORV_4	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione	Attivo	In esecuzione	
Città metropolitana di Torino	58	D1-CMTO	Mip al Top	Attivo	In esecuzione	
	59	D2-CMTO	Top Edge	Attivo	In esecuzione	
	60a	D3-CMTO_1	Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	Attivo	In esecuzione	
	60b	D3-CMTO_2	Fa Bene: materiali promozionali	Attivo	In esecuzione	posa in corso

I grafici sottostanti rappresentano gli stati di attuazione dei precedenti monitoraggio (gennaio/giugno 2019, luglio/dicembre 2019, gennaio/giugno 2020/2020, giugno/dicembre 2020) e del presente monitoraggio.

Come si può notare, in ogni monitoraggio si registra un netto avanzamento di stato di molti interventi, lo "svuotamento" progressivo dei due

stadi iniziali di progettazione a favore dell'esecuzione e ,da questa, allo "stato finale" e al "collaudo".


In particolare, lo stato di attuazione del presente monitoraggio conferma il trend di avanzamento verso lo stato di collaudo.

Si precisa che lo stato di collaudo racchiude altresì gli interventi ultimati e tra questi i 23 interventi per i quali è già stata trasmessa la documentazione finale per l'erogazione dell'ultima quota di contributo.


Complessivamente, il Progetto ToP Metro della Città metropolitana procede regolarmente e la sua attuazione è perfettamente in linea con i cronoprogrammi autorizzati.

Il grafico sottostante mostra e conferma il trend di avanzamento di stato degli interventi.


Attuazione al 30 giugno 2019

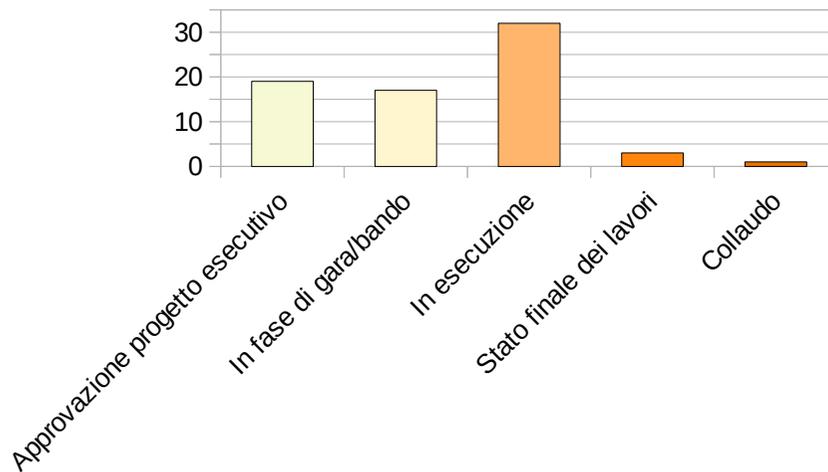


Attuazione al 31 dicembre 2019

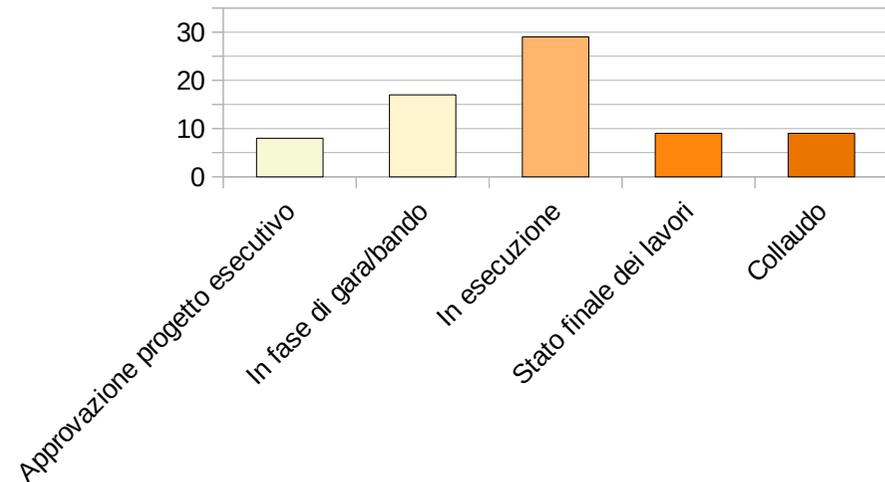


Attuazione al 30 giugno 2020

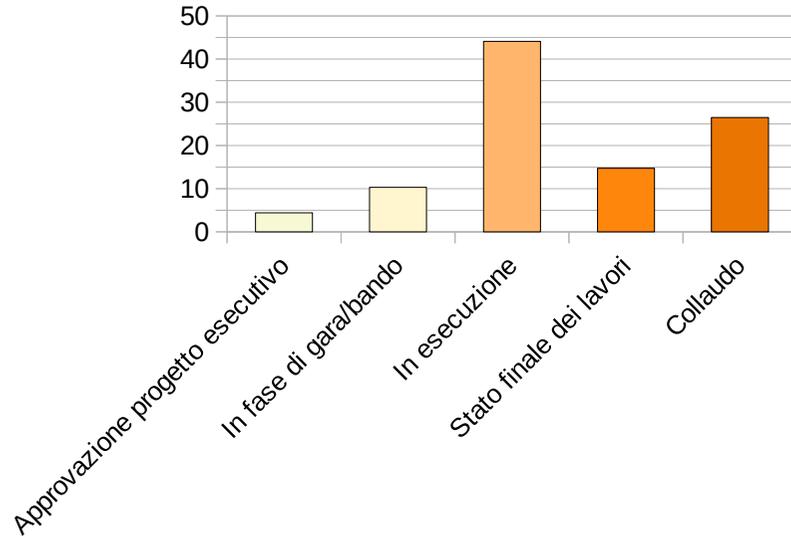

Attuazione al 31 dicembre 2020

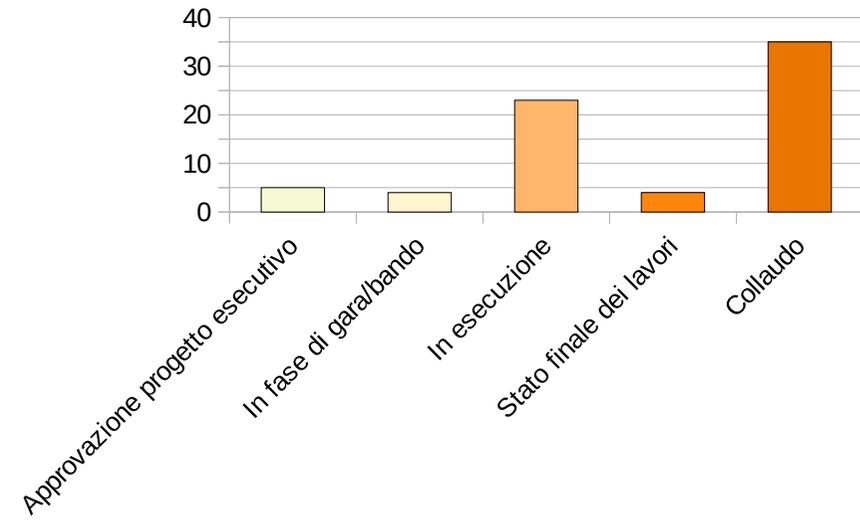

Attuazione al 30 giugno 2021

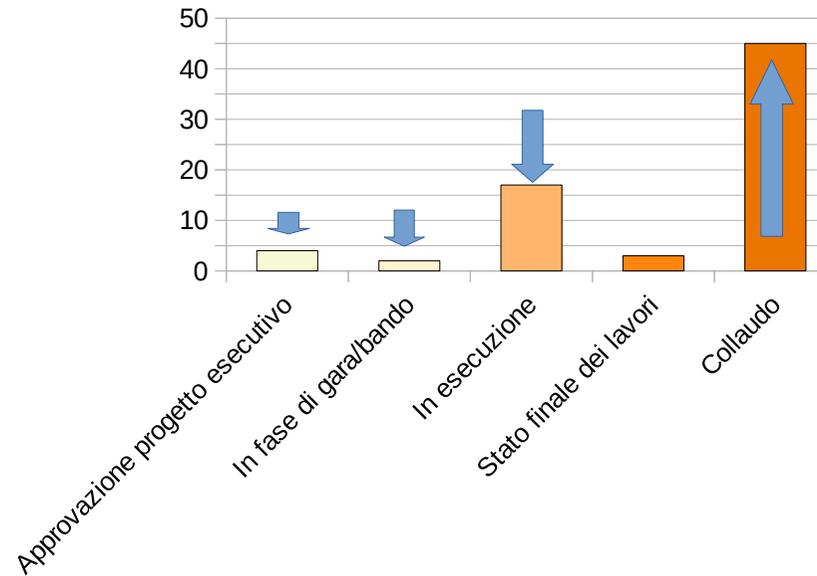

2. OSSERVAZIONI SINTETICHE SULL'ANDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI

La successiva tabella indica i dati finanziari e le eventuali variazioni rispetto alle somme inizialmente previste. I dati recepiscono le rimodulazioni approvate e le richieste delle quote finali a conclusione degli interventi.

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
1	A1-BEI	Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest	160.000,00		160.000,00	118.026,64	Intervento ultimato.
2	A2/A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento	1.391.031,66		1.391.031,66	987.005,71	Il costo totale riporta il corretto importo del finanziamento statale così come indicato nella rimodulazione licenziata dalla Presidenza approvata con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0000764 del 15 maggio 2018, che ha riconosciuto all'intervento un importo pari a € 1.391.031,66. Intervento ultimato.
3	A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero	112.000,00		112.000,00	89.928,57	Intervento ultimato.
4	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	260.000,00	24.000,00	284.000,00	248.180,30	A seguito della definizione della progettazione, è stato aggiunto come cofinanziamento comunale. Intervento ultimato

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
5	B2-BEI	Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto	164.297,00		164.297,00	142.257,97	Intervento ultimato.
6	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo Lotto I	2.000.000,00	1.822.111,00	3.822.111,00		A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 2.793.057 è definito in euro 1.822.111
7a	A1-COL	Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio.	100.000,00		100.000,00		Nessuna modifica
7b	A2-COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	350.000,00		350.000,00		Nessuna modifica
8a	B1a-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	300.000,00		300.000,00		Nessuna modifica
8b	B1b-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	300.000,00		300.000,00		Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
8c	B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness diffuso	300.000,00		300.000,00		Nessuna modifica
8d	B3a-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	120.000,00		120.000,00		Nessuna modifica
8e	B3b-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	280.000,00		280.000,00		Nessuna modifica
9	B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	100.000,00		100.000,00		Nessuna modifica
10	B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	2.570.000,00	2.000.000,00	4.570.000,00		In fase di esecuzione si sono rese necessarie alcune prestazioni aggiuntive
11	C1/2/3-COL	Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto	368.650,00	61.350,00	430.000,00		Nessuna modifica
12a	A3/D1a/ D3/D4-COL	Riquilificazione urbana e coesione sociale	500.000,00		500.000,00		Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
12 b	D1b-COL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	90.000,00		90.000,00	89.632,18	L'importo di aggiudicazione è stato aggiornato a seguito dell'applicazione all'intervento del regime Iva del 22% (vedi DD n. 1169/2019). Intervento ultimato
13	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro	700.000,00	50.000,00	750.000,00		A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale è stato definito in euro 50.000. Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante sostenuta dal Comune..
14	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	300.000,00		300.000,00		A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 5.000,00 è stato eliminato.
15	B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	1.670.000,00	395.500,00	2.065.500,00		A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale è stato definito in euro 395.500,00.
16 a	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	150.000,00	5.000,00	155.000,00	124.634,58	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale è stato definito in euro 5.000. Intervento ultimato
16 b	C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.696,94	Intervento ultimato

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
16 c	C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	60.000,00		60.000,00	52.978,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 5.000 è stato eliminato. Intervento ultimato
16 d	C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	30.000,00		30.000,00	29.280,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 4.500 è stato eliminato. Intervento ultimato
17	B1-MON	Riquilibrata di arterie viarie - C.so Trieste	480.000,00		480.000,00	405.018,63	Intervento ultimato
18	B2-MON	Riquilibrata di arterie viarie - Via Pastrengo	615.000,00		615.000,00	435.228,14	Intervento ultimato
19	B3-MON	Riquilibrata di arterie viarie - Str. Stupinigi	346.000,00		346.000,00	251.953,95	Intervento ultimato
20	B4-MON	Riquilibrata di arterie viarie - P.zza del Mercato	132.000,00		132.000,00	94.290,88	Intervento ultimato
21	B5-MON	Riquilibrata di arterie viarie - Str. Palera	266.000,00		266.000,00	163.512,60	Intervento ultimato
22	B6-MON	Riquilibrata di arterie viarie - Str. del Bossolo	95.000,00		95.000,00	81.581,29	Intervento ultimato

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
23	B7-MON	Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie	500.000,00		500.000,00	342.413,27	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento). Intervento ultimato
24	C2-MON	Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - Nuova Caserma Polizia Locale	1.500.000,00		1.500.000,00		rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
25	E2-MON	Adeguamento Scuola Luigi Pirandello	50.000,00		50.000,00	39,334,27	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018. Intervento ultimato
26	E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	99.000,00		99.000,00	73.502,69	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento). Intervento ultimato
27	E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	300.000,00		300.000,00	201.355,76	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento). Intervento ultimato
28	E5-MON	Installazione nuove postazioni Bike Sharing	51.000,00		51.000,00		rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
29	C1-NIC	Manutenzione straordinaria caserma carabinieri	450.000,00	150.000,00	600.000,00		A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 150.000. Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante sostenuta dal Comune..

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
30	E1 - NIC	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto	1.540.000,00	40.000,00	1.580.000,00		A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 40.000. Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante sostenuta dal Comune.
31	E2 - NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni	63.000,00		63.000,00		Nessuna modifica
32	B1-ORB	Rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale e restauro conservativo del Palazzo Comunale e del campanile in Piazza Umberto I	1.795.512,00		1.795.512,00		Nessuna modifica
33	B2-ORB	Restauro conservativo e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	1.543.573,00		1.543.573,00		A seguito della definizione della progettazione, il contributo è stato precisato in euro 1.543.573,00

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
34	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e riqualificazione del sito	160.000,00	2.983,87	162.983,87	98.028,69	in conseguenza alle maggiori spese tecniche pari a € 2.983,87 sostenute con risorse comunali e senza modifiche al contributo richiesto l'importo totale dell'intervento è stato aggiornato. Intervento ultimato
35	B1-RIV	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	217.593,20	64.581,47	282.174,67	208.218,19	Intervento ultimato

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
36	B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	645.999,08	427.109,03	1.073.108,11		Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020 con contestuale richiesta di proroga dei lavori . Il contributo è stato rimodulato (da € 543.257,69 a € 645.999,08). A seguito della 1° perizia di variante resasi necessaria a seguito di problematiche non prevedibili e valutabili al momento della progettazione il costo totale dell'opera e' variato da € 683.643,98 a € 851.319,62 come indicato nella rimodulazione accolta. La redazione della 2° variante, resasi nuovamente necessaria per cause impreviste ed imprevedibili ha portato il totale complessivo dell'opera a € 1.073.108,11, incrementando la quota parte a carico del Comune.

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
37	B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari	301.003,93	157.469,10	458.473,03	345.131,13	Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020 E' variato il costo totale, incrementando la quota parte a carico del Comune (da € 398.474,37 a € 458.473,03) a seguito di perizia di variante resasi necessaria a seguito di problematiche non prevedibili o valutabili al momento della progettazione. Intervento ultimato
38	B8.1-RIV	Riquilificazione zona di Via Ivrea	0,00				Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020
39	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione sistema di videocontrollo del territorio	2.611.000,00		2.611.000,00		Nessuna modifica
40	A1-SAN	Sistemazione Area verde di Via del Porto	120.000,00		120.000,00		Nessuna modifica
41	A2-SAN	Riquilificazione di Via Mirande	258.500,00		258.500,00		Nessuna modifica
42	A3-SAN	Lavori di riquilificazione di Via Casale	250.000,00		250.000,00		Nessuna modifica
43	B1-SAN	Area verde Pragranda	858.800,00		858.800,00		Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante sostenuta dal Comune.

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
44	C1-SAN	San Mauro Sicura	339.160,00		339.160,00		Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante sostenuta dal Comune.
45	C2-SAN	realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy	160.000,00		160.000,00		Nessuna modifica
46	A1-SETT	Riquilibrare di via Roma in Settimo Torinese	142.550,00		142.550,00		Nessuna modifica
47	B1-SETT_2	Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale	1.000.000,00		1.000.000,00		Nessuna modifica
48	B3-SETT	Riquilibrare impianti sportivi scuola media statale "A. Gramsci"	288.474,00		288.474,00		rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
49	B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	2.249.953,00		2.249.953,00		Nessuna modifica
50	A2-VEN	Riquilibrare sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	410.000,00	590.000,00	1.000.000,00		Nessuna modifica
51	B2.1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici (MAN. FASE 4)	605.000,00	245.000,00	850.000,00		A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 375.000 si è ridotto a euro 245.000,00
52	B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	645.000,00		645.000,00		Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
53	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	180.836,20		180.836,20		Nessuna modifica
54	D1-VEN	Progetto Housing Sociale "Cà Buozi"	70.000,00		70.000,00		Nessuna modifica
55	E2-VEN-A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	600.000,00	350.000,00	950.000,00		È stato aumentato il contributo comunale
56	E3-VEN - A3	Riquilificazione impianti Illuminazione Pubblica	500.000,00		500.000,00		Nessuna modifica
57 a	E1-CORV_1	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Governance	241.054,32		241.054,32		Nessuna modifica
57 b	E1-CORV_2	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	549.000,00		549.000,00		Nessuna modifica
57 c	E1-CORV_3	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	199.829,90		199.829,90		Nessuna modifica
57 d	E1-CORV_4	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione	270.000,00		270.000,00		Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Costo Totale a conclusione dei lavori (per gli interventi che hanno richiesto la quota finale del contributo)	Eventuali variazioni finanziarie
58	D1-CMTO	Mip al Top	500.000,00		500.000,00		Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020
59	D2-CMTO	Top Edge	2.500.000,00		2.500.000,00		Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020
60 a	D3-CMTO_1	Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	417.187,50	139.062,50	556.250,00		Nessuna modifica
60 b	D3-CMTO_2	Fa Bene: materiali promozionali	105.000,00		105.000,00		

3. CONTESTO PROGRAMMATICO

La tabella seguente riporta il quadro finanziario, lo stato di avanzamento, nonché le eventuali variazioni progettuali e/o criticità riscontrate, relativamente agli interventi che rientrano nel Progetto "ToP Metro", **ma che non sono finanziati a valere sul Programma** per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Rispetto al precedente monitoraggio non si segnalano variazioni del quadro finanziario.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Beinasco	A2/A3-BEI	Intervento privato di riordino urbanistico e riqualificazione di aree industriali dismesse per realizzazione di nuove attività di terziario commerciale		€ 2.025.897,00	€ 2.025.897,00	Le opere di urbanizzazione annesse all'intervento sono state concluse in data 18.11.2019. In data 11.3.2020 il collaudatore ha redatto il collaudo delle opere. Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 22 dicembre 2020 sono stati approvati lo "Stato Finale" ed il Certificato di Collaudo relativi alle opere di riqualificazione, manutenzione straordinaria e posa di arredo urbano inerenti il riordino urbanistico dell'area PC e PT-CDAL3 del vigente P.R.G.C. e dal permesso a costruire convenzionato n. 2015/39
Borgaro	B2-BOR	Riqualificazione area Ex Marchiolatti - edilizia residenziale		€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	Nonostante le criticità connesse alla contrazione del mercato immobiliare, l'intervento privato è stato avviato e si prevede che si concluderà entro il 2022 .
	B3-BOR	Riqualificazione area Ex Marchiolatti - centro commerciale		€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento privato è stato avviato, in ragione delle criticità connesse alla contrazione del mercato immobiliare e dell'emergenza COVID – 19, si prevede che si concluderà dopo il 2023 .
Collegno	A2-COL	Intervento comunale – Aree verdi occupate e/o abbandonate	€ 400.000,00		€ 400.000,00	L'intervento è stato avviato attraverso due lotti, per la riqualificazione delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> - Giardino Matanzas – Via Alpignano - Giardino Neubrandenburg – C.so Francia 234 - Giardino Neubrandenburg – C.so Francia 234 - Giardino Corso Antony - Piazza Che Guevara - Giardino Via della Croce Con DD. 974/2019 si è approvato il CRE. L'intervento è concluso

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	A2-COL	intervento privato - Aree verdi occupate e/o abbandonate		€ 80.000,00	€ 80.000,00	Nell'ambito dell'insediamento di nuovo impianto di discarica della Soc.Barricalla, con Decreto n. 257-15645 del 30/06/2016, la Città Metropolitana di Torino ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinata alla realizzazione di un intervento compensativo, mediante reimpianto boschivo in un'altra area o di riqualificazione della vegetazione esistente in aree parco del Comune di Collegno. Tali interventi compensativi sono stati definiti con una convenzione, schema approvato con DGC n.170 del 7/6/2017, tra l'Amm. Comunale e la Soc. Barricalla (rep. n.9362 del 9.10.2017) che ha versato l'importo dovuto al Comune che ha provveduto ad avviare l'iter per la selezione del soggetto a cui affidare la piantumazione dei nuovi boschi urbani. L'intervento si è concluso nel 2017 con la realizzazione di :scarpate corso Francia 2700 mq, scarpata via della Croce 3000 mq, scarpata corso Kennedy/Neruda 1000 mq

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	A3-COL	intervento comunale - Riquilificazione urbana	€ 357.777,71		€ 357.777,71	<p>Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159/2018 il Comune di Collegno ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI STECCATI DI RECINZIONE IN LEGNO E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI DI CORSO FRANCIA 291 E 333.</p> <p>L'intervento sarà attuato, anche sulla scorta degli accordi in essere con l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in forza di Deliberazione di Consiglio n. 104 del 29.09.2016, mediante l'utilizzo dei fondi accantonati in gestione speciale ai sensi legge 513/1977 art. 25. Per gli interventi relativi alla sostituzione degli steccati di recinzione in legno è munito del parere autorizzativo, ai sensi degli art. 10-12-21 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. , rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 13.02.2018.</p> <p>Intervento in corso - sono in corso richieste di proroghe.</p>
	B1-COL	Intervento comunale - ricuciture e sicurezza stradale: Opere Unity	€ 438.036,00		€ 438.036,00	<p>L'intervento ha subito un rallentamento dovuto all'emergenza Covid ed a richieste di varianti al permesso di costruire. E' stimata la fine lavori per fine 2023</p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
		Villaggio Dora - Opere in ambito - SILE.	€ 627.101,00		€ 627.101,00	Intervento concluso
		Villaggio Dora - Contributo versato - SILE.	€ 287.511,00		€ 287.511,00	Intervento concluso
		Fognature	€ 140.000,00		€ 140.000,00	Intervento concluso . Con Determinazione Dirigenziale n. 932/2019 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione .
		Manutenzione straordinaria Strade	€ 688.000,00		€ 688.000,00	Con Determinazione Dirigenziale n. 915/2019 è stato esteso l'importo contrattuale ed approvato un QTE complessivo di € 688.000 rispetto agli iniziali 460.000. Conseguentemente è stato esteso il croprogramma lavori e di spesa. Tutti gli interventi sono conclusi
		Movicentro 1 - lotto 2	€ 261.368,00		€ 261.368,00	Intervento concluso . Con Determinazione Dirigenziale n. 28/2018 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione .
		tot.	€ 2.214.016,00		€ 2.214.016,00	
	B1-COL	Intervento privato- ricuciture e sicurezza stradale:				
		Urbanizzazioni Leroy Merlin		€ 204.928,00	€ 204.928,00	Intervento concluso
		Urbanizzazioni fuori ambito Unity		€ 865.490,00	€ 865.490,00	L'intervento ha subito un rallentamento dovuto all'emergenza Covid e richieste di varianti al permesso di costruire. E' stimata la fine lavori per fine 2023
		Villaggio Dora - Urbanizzazione - Sile		€ 195.500,48	€ 195.500,48	Intervento concluso
		tot.		€ 1.265.918,48	€ 1.265.918,48	

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B2-COL	Intervento comunale - playground	€ 100.000,00		€ 100.000,00	Sono state riqualificate le seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> • Campo calcetto Piazza Repubblica • Giardino via Marzabotto a Savonera • Recinzioni Playground Skate Park • Area Fitness Parco Dalla Chiesa L'intervento è concluso .
	B3-COL	intervento comunale - piazze da qualificare	€ 1.008.452,00		€ 1.008.452,00	In data 30/12/2011 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, la Città di Collegno, Infra.To s.r.l. e GTT S.p.a.; Con DGC 4570 del 2017 e DGC 390 del 13/12/2017 il Comune di Torino e il Comune di Collegno hanno approvato un "addendum contrattuale", sottoscritto in data 07/03/2018 REP 9417/U. Con Determinazione Dirigenziale n. 201/2018 è stato approvato il prog. definitivo. Con Determinazione Dirigenziale n. 689/2018 è stato approvato il prog. esecutivo ed autorizzato Infrato quale soggetto attuatore a pubblicare il bando di gara. Con atto dell'AU n. 50 del 30/07/2018 Infra.To ha preso atto della validazione del prog. esecutivo effettuata dal RUP e ha indetto la procedura aperta n. 05/2018; Con Determinazione dell'AU n. 70 del 21/11/2018 l'appalto è stato aggiudicato all'ATI Ditta CITRINITI. con DD n. 1300/2019 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva. Con DD. 368/2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e il Saldo dei trasferimenti. L'intervento è concluso .

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B5-COL	Intervento comunale - recupero spazi pubblici abbandonati	€ 4.027.499,00		€ 4.027.499,00	L'intervento è in corso e non presenta criticità. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2022. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 25.07.2018 l'Ente ha approvato il progetto definitivo-esecutivo del LOTTO I B (parte integrante del LOTTO I A di cui alla pregressa DD 220/2018), nonché in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo del LOTTO II. Con Determinazione 1486 del 20/12/2018 l'Ente ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, aggiornando il quadro tecnico economico, nonché disposto l'avvio della procedura di gara aperta per l'aggiudicazione dei lavori. Con Determinazione n. 566/2019 è stato disposta l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico: CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa. l'intervento <u>in corso di attuazione e si concluderà entro il 2022.</u>
	B5-COL	Intervento privato- recupero spazi pubblici abbandonati:				
		Villaggio Dora - Costo costruzione - SILE		€ 3.390.070,00	€ 3.390.070,00	Intervento concluso
		Compagnia di San Paolo- edificio Certosa - stierie.		€ 150.000,00	€ 150.000,00	Intervento concluso
		PIP - Leroy Merlin		€ 437.059,00	€ 437.059,00	Intervento concluso
		tot.		€ 3.977.129,00	€ 3.977.129,00	
	D1/2/4-COL	intervento comunale- avvicinare le istituzioni ai cittadini.	€ 277.730,00		€ 277.730,00	Con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del comune di Collegno n.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
		Un nuovo modello di gestione. Partecipare alla cura degli spazi per ridare la città ai cittadini				117/2017 è stato aggiudicato il Servizio per gli anni 2017/2020. Con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Collegno n. 91/2020 è stato prorogato il Servizio per il periodo 10/03 - 15/07/2020 e con successiva DD n. 621/2020 del medesimo Dirigente il servizio è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2020. Il servizio si è concluso in data 31/12/2020.
		Intervento comunale- Coesione sociale e sostegno al reddito				
		Intervento privato - Coesione sociale e sostegno al reddito		€ 79.500,00	€ 79.500,00	
Grugliasco	B1-GRU	Intervento privato - Riquilificazione viabilità quartiere ATC		€ 73.000,00	€ 73.000,00	E' in corso la progettazione esecutiva. I lavori verranno realizzati in contemporanea all'intervento pubblico e pertanto entro il 09/08/2021
	B2-GRU	Intervento privato - Riquilificazione viabilità borgata Gerbido		€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	Le indagini ambientali sul terreno sono state completate senza evidenziare necessità di interventi di bonifica. Il perfezionamento dell'atto di cessione gratuita al comune è previsto per il 2021 . Successivamente il Comune procederà alla vendita delle aree edificabili destinando gli introiti previsti, stimati in € 3.500.000,00 ad opere di urbanizzazione e di riqualificazione urbana e di spazi pubblici nella stessa Borgata Gerbido.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Moncalieri	C1-MON	Canale scolmatore	€ 3.918.000,00	€ 2.072.000,00	€ 5.990.000,00	L'intervento è stato affidato ed è in corso di esecuzione. E' stata effettuata a consegna definitiva dei lavori il 29/08/2019 ed è in corso di esecuzione. Con D.D. n. 946 del 09/06/2020 del è stato approvato il I SAL a tutto il 24/05/2020. Con D.D. n.2486 DEL 22/12/2020 è è stato modificato l'incarico affidato per la redazione di perizia di variante, per sostituzione della categoria d'opera ed inclusione di nuove lavorazioni. E' emersa la necessità di provvedere alla ri-progettazione delle opere in c.a. e la necessità di considerare i maggiori costi della sicurezza, c.d. "costi Covid-19", a carico della stazione appaltante. Indicativamente la conclusione è prevista per fine Dicembre 2021 ,salvo imprevisti.
	E2-MON	Intervento comunale - Adeguamento L. Pirandello	€ 250.000,00		€ 250.000,00	Intervento concluso

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Nichelino	E2-NIC	Intervento privato - Biblioteca Arpino		€ 50.000,00	€ 50.000,00	<p>La rifunzionalizzazione complessiva della Biblioteca Civica G. Arpino è subordinata alla ricollocazione della Ludoteca Comunale, ora inserita al piano terra della struttura. Lo spostamento della Ludoteca è previsto nei locali comunali dell'ex piscina sita in Nichelino ,Via XXV Aprile (progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.148 del 10/09/2019). Con Determinazione Dirigenziale n.527 del 15/6/2020 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi previsti presso la Biblioteca G.Arpino. Con Determinazione Dirigenziale n.1839 del 26/11/2020 "Biblioteca G.Arpino – Rifunzionalizzazione spazi funzionali, adeguamento impiantistico e lavori edili - Servizio arch e ing.inerente prog.definitiva ed esecutiva e coord.sicurezza in fase di progettazione –si è provveduto all'aggiudicazione e impegno di spesa . L'intervento per la Biblioteca Civica Arpino verrà concluso entro il termine previsto di novembre 2022.</p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Orbassano	B3-ORB	Realizzazione di spazi pubblici		€ 424.063,00	€ 424.063,00	L'intervento privato, consistente nella realizzazione di spazi pubblici, attualmente risulta non ancora avviato per ragioni attribuibili all'operatore privato. La convenzione urbanistica vale tuttavia fino al 2023 e quindi i lavori dovranno comunque concludersi entro il 2026 .
	B4-ORB	Realizzazione di parcheggio		€ 400.000,00	€ 400.000,00	I lavori sono conclusi e l'intervento collaudato con D.G.C.n. 56 del 27/05/2020.
Rivoli	B2-RIV	Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli	€ 57.011,32		€ 57.011,32	Intervento concluso . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 1240 del 06/12/2017.
	B4-RIV	Manutenzione palestra plesso Gobetti	€ 66.993,72		€ 66.993,72	intervento concluso . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 272 del 20/03/2019.
	B5-RIV	Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen, Makarenko e Don Locanetto	€ 418.581,58		€ 418.581,58	Intervento concluso . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 1300 del 04/12/2018 (2° lotto - scuole Makarenko e don Locanetto) e D.D. n. 631 del 13/06/2019 (1° lotto – scuola Andersen).
	B7-RIV	Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e sottoservizi	€ 965.318,43		€ 965.318,43	Intervento concluso . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 497 del 29/04/2019.
	B8.1-RIV	Riqualficazione zona di Via Ivrea (completamento e rifacimento marciapiede, sistemazione parcheggi pubblici e aree ecologiche, sostituzione impianti illuminazione obsoleti ed inefficienti)	€ 295.406,54	€ 153.754,98	€ 141.651,56	Inizio lavori 23.04.2018, fine lavori 20.12.2018, intervento concluso e collaudato
	B8.2-RIV:	Intervento residenziale privato di riplasma tura/riuso di volumetrie preesistenti		€ 2.209.379,74	€ 2.209.379,74	Intervento concluso

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B9-RIV	Intervento privato di ampliamento sede stradale		€ 190.000,00	€ 190.000,00	Intervento concluso . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 4 del 13/01/2020
Settimo	B1-SETT.1	Intervento privato - Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	Intervento concluso
	B5-SETT	Realizzazione parcheggio area Stazione Ferroviaria	€ 68.000,00		€ 68.000,00	Intervento concluso
	B6-SETT	Nuovo palazzetto dello sport	€ 6.288.000,00		€ 6.288.000,00	l'intervento è in corso. consegnato lavori in data 1/10/2019,emesso SAL n. 3, fine lavori prevista 02/08/2021
	C1-SETT	Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi della Città	€ 50.400,00		€ 50.400,00	Intervento concluso
Venaria	A1-VEN	Riquilificazione e rifunionalizzazione aree verdi	€ 150.000,00		€ 150.000,00	Intervento concluso . Con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 20,03,2018 è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori.
	A3-VEN	Riquilificazione facciate degradate nel Centro Storico	€ 510.000,00	€ 170.000,00	€ 680.000,00	L'intervento è in corso , non presenta criticità. Sono in fase di rendicontazione le ultime due richieste di finanziamento. E' in fase di definizione una ulteriore pratica di Piazza Annunziata 6. Si prevede la conclusione nel 2021 .

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	A4-VEN	Recupero e rifunzionalizzazione del comprensorio denominato Ex-Opificio Galleani		€ 3.174.000,00	€ 3.174.000,00	L'intervento è in corso . Sebbene siano state evidenziate dal privato alcune criticità finanziarie dovute alla crisi economica, si prevede che l'intervento si concluderà entro il 2023 . L'assetto della proprietà dell'Opificio non risulta ancora definita pertanto potrebbero generarsi dei ritardi nell'ultimazione dell'intervento aggravati dall'emergenza COVID – 19.
	B1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali	€ 430.000,00		€ 430.000,00	Con determinazione dirigenziale n. 777 del 10/10/2018 sono stati aggiudicati i lavori. I lavori sono conclusi in data 26/06/2020
	B2.2-VEN	Manutenzione e restauro copertura sede comunale di Piazza Martiri della Libertà	€ 235.000,00		€ 235.000,00	L'intervento è stato rimodulato in quanto in fase di progettazione è emersa la necessità di sostituire la struttura portante della copertura. Conseguentemente si è reso necessario procedere con la valutazione della vulnerabilità sismica. Attualmente l'Amministrazione sta predisponendo gli atti per l'approvazione del piano triennale dei LL.PP. Per aggiornare le risorse economiche. Fine lavori prevista 30/09/2022

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B4-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. fase 3.	€ 930.000,00		€ 930.000,00	Il 15/06/2020 sono stati consegnati anticipatamente i lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge (art. 32 comma 8 ex D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.). Con Deliberazione del sub Commissario n. 68 del 14/07/2020 sono state approvate le modifiche al progetto esecutivo ai sensi art. 106 comma 2 ex D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. Con Deliberazione del sub Commissario n. 95 del - 10/08/2020 sono state approvate ulteriori modifiche al progetto esecutivo ai sensi art. 106 comma 2 ex D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. Con D.D. n. 585 del - 11/11/2020 è stata autorizzata una proroga contrattuale. Dopo una sospensione dei lavori (Verbale di sospensione del 28/12/2020) ed alcune modifiche contrattuali ai sensi art. 106 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016 s.m. ed i. , i lavori sono stati conclusi . Fine lavori 30/04/2021
	B5-VEN	Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola De Amicis	€ 120.000,00		€ 120.000,00	I lavori si sono conclusi in data 20/05/2019, in anticipo di 30 giorni rispetto al cronoprogramma. Collaudo approvato con determinazione n. 712 del 14/10/2019
	D1-VEN	Intervento comunale - Progetto Housing sociale "Cà BuoZZi"	€ 57.956,60		€ 57.956,60	Il progetto prevede l'attivazione di tirocini per la messa in campo di politiche attive del lavoro. L'emergenza Covid ha visto la sospensione dell'attivazione dei tirocini e contemporaneamente è scaduta la Convenzione con il gestore del servizio a livello comunale. Si sta procedendo nella trattativa per il nuovo contratto al quale farà seguito l'attivazione dei tirocini.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	E1-VEN	Riqualficazione spazi pubblici e attuazione Zone 30 KM/h	€ 600.000,00		€ 600.000,00	Intervento concluso . Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 13/03/2018 è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori.
	E4-VEN	Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia regionale	€ 1.553.543,54		€ 1.553.543,54	intervento concluso in data 28/05/2020 collaudo emesso in data 08/07/2020
	E5-VEN	Miglioramento della qualità delle fermate del trasporto pubblico locale	-	-	-	Intervento concluso
	E6-VEN	Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, bike sharing		€ 12.500,00	€ 12.500,00	L'intervento è concluso .
	E7-VEN	Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi elettrici	-	-	-	L'intervento è in corso .

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Città metropolitana di Torino	D1-CMTO	Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP	€ 7.933.200,00		€ 7.933.200,00	<p>Dopo i positivi risultati raggiunti dal Programma Mip nel periodo 2017-2019, la Regione Piemonte ha rifinanziato il Programma con uno stanziamento di risorse aggiuntive, sempre a valere sul Por Fse, per il periodo 2020-2022. Il Programma Mip fino al 31/12/2022 potrà contare su risorse aggiuntive per l'area di Città Metropolitana pari a € 3.988.500, come previsto nella rimodulazione presentata.</p> <p>Le attività del Programma Mip relative al biennio 2016-2018 si sono concluse dopo proroga, il 31/12/2019. Da settembre 2020 le attività del Programma Mip sono riprese a pieno regime dopo l'interruzione dei servizi individuali legata anche all'emergenza Covid.</p> <p>L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha rallentato il riavvio del programma Mip dopo l'interruzione al 31/12/2019. Il programma ha ripreso la propria operatività grazie anche alla possibilità di erogazione a distanza e risente della fase di incertezza economica che non favorisce la nascita di nuove attività.</p> <p>Le attività del Programma Mip sono state rifinanziate per il periodo 2019-2022 e si concluderanno il 31/12/2022, come previsto nella rimodulazione presentata.</p>

Stato di attuazione degli interventi che rientrano nel Progetto "ToP Metro", ma che non sono finanziati a valere sul Programma

